




2019-ben érkeznek az első nyaralóhajók

Sztilkovics Szávó
vezérigazgató
Mahart Zrt.



A projekt eddigi eredményei



- 2018. januárban indult a projekt 1 fővel
- Február: 3 fő dolgozik a projektben
- Március: támogatási szerződés megkötése 100 millió forinttal
- Április: elindult a kikötőtervezés és a hajók közbeszerzési eljárása
- December: befejeződött a hajók közbeszerzési eljárása és elindult a kikötői közbeszerzés



A projekt teljes költségvetése 4,66 milliárd forint

Hajóbeszerzés

- A hajóbeszerzés tervezett költségvetése 1,6 milliárd forint volt, **végül a 1,51 milliárd forintba** kerül a hajók beszerzése
- Összesen 10 nyaralóhajó érkezik 2019. májusig:
 - 4 db 4 személyes
 - 2 db 6 személyes
 - 4 db 8 személyes
- További 10 hajó érkezése 2020-ig

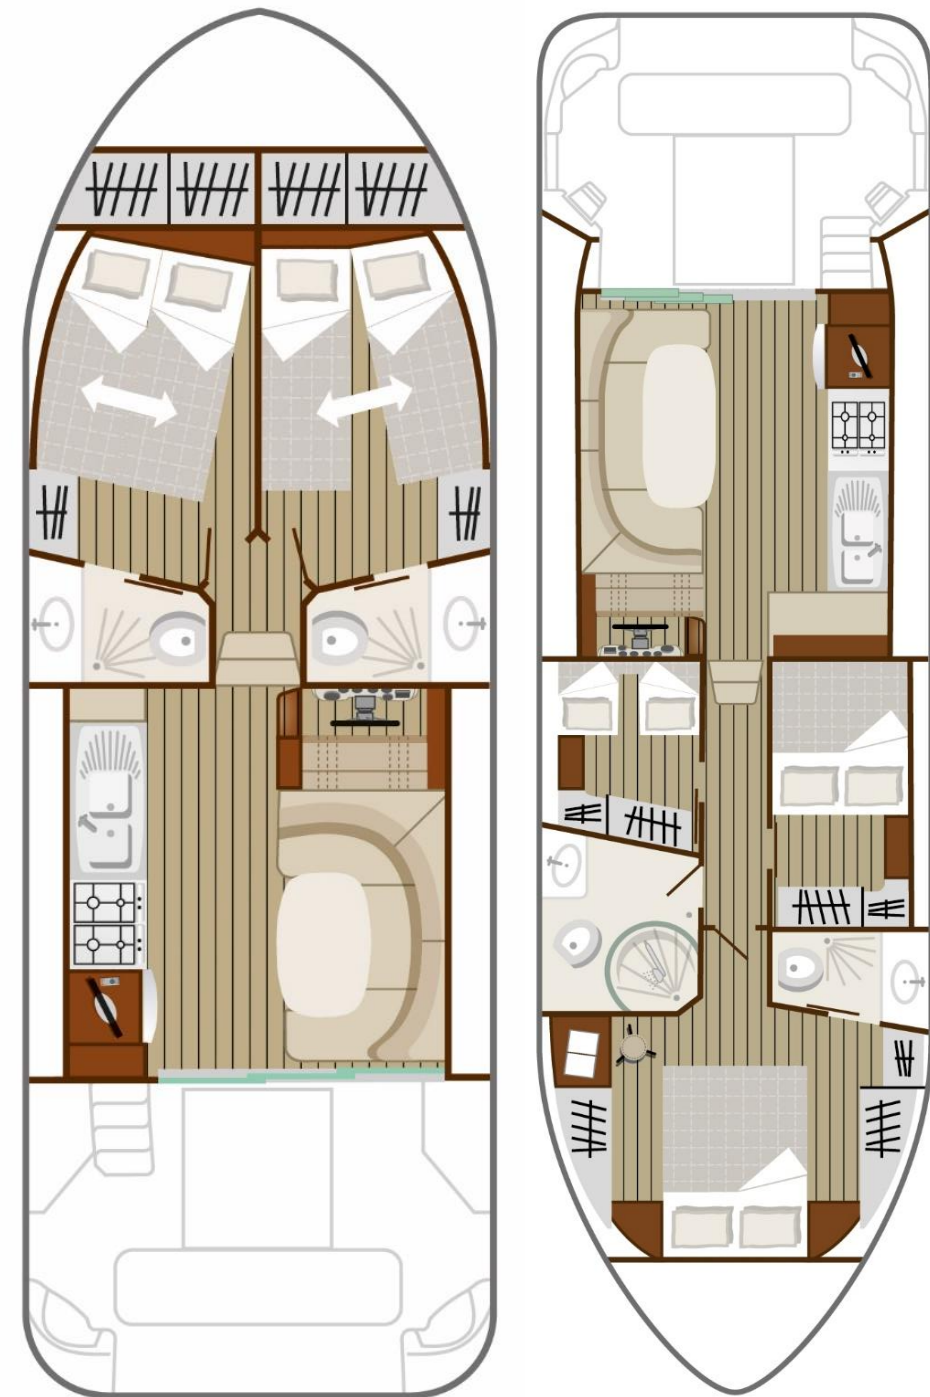

Előttünk álló feladatok

- Kikötők építése
- További infrastrukturális feltételek kialakítása
- Tesztüzem elindítása 2019 nyarán
- Kormányzattal közösen: jogszabályi feltételek megteremtése
- Az első hajó érkezése: február 21.
Utazás Kiállítás

